پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات · ارائه تصمیم‌محور · ۱۴۰۵

از ارزیابی پرونده
به راهبری سرمایه‌گذاری فناورانه

عارضه‌یابی فرایند حمایت شبکه تاد و پیشنهاد مدل شش‌ایستگاهی برای انتخاب، ارزش‌گذاری و پایش طرح‌ها

دامنه بررسی
فراخوان ۱۸ · مرکز ۱۴ · استان ۲۶۲ · ۸ ثبت‌نام

روش
تحلیل کمّی داده‌ها و مصاحبه با داوران

مخاطب
معاونت توسعه فناوری پارک فاوا

۰۲

سه مسئله، یک تغییر ضروری

خلاصه مدیریتی

۱

تحقق حمایت با گلوگاه روبه‌روست.

در داده‌های ارائه‌شده، ۳۸.۶۵ میلیارد تومان معادل ۲۷.۲٪ مصوب پارک، در ۳۲ پرونده از دستور کار خارج شده است؛ ۲۱ پرونده با علت غالبِ نقص مدارک.

۲

تصمیم پارک الزاماً به تأمین مالی منتهی نمی‌شود.

از ۱۴۲.۱ میلیارد تومان مصوب پارک، ۸۴.۴۵ میلیارد تومان در صندوق تصویب شده است؛ معادل ۵۹.۴٪ مصوبه پارک.

۳

پیشنهاد، تغییر کل چرخه حمایت است.

مدل شش‌ایستگاهی، غربالگری صلاحیت را به ارزش‌گذاری، تعیین حمایت مرحله‌ای و پایش اثر متصل می‌کند.

درخواست از جلسه: موافقت با اجرای پایلوت مدل، تعیین مالک اجرایی، و آغاز مذاکره با صندوق برای هم‌راستاسازی مراحل ارزیابی و پرداخت.

این جلسه، تصمیم‌گیری درباره سه خروجی می‌خواهد: موافقت اصولی با پایلوت، تعیین مالک اجرایی، و شروع مذاکره با صندوق.

۰۳

گلوگاه اصلی در تبدیل ثبت‌نام به پرداخت دیده می‌شود

وضعیت موجود

خروج از دستور
۳۸.۶۵ م.ت
جزئیات

مصوب صندوق
۸۴.۴۵ م.ت
جزئیات

مصوب پارک
۱۴۲.۱ م.ت
جزئیات

پذیرش
۴۲٪ · ۱۱۰
جزئیات

داوری‌شده
۶۴٪ · ۱۶۸
جزئیات

ثبت‌نام
۲۶۲ طرح
جزئیات

توزیع سطح آمادگی فناوری

۸۱٪

از طرح‌ها در سطح TRL ۴–۶



TRL ۱–۳ · ۹.۱٪

TRL ۴–۶ · ۸۱.۵٪


TRL ۷–۹ · ۹.۴٪

تمرکز جغرافیایی

استان = ۴۸٪ ثبت‌نام ۳



قیف تبدیل · ثبت‌نام تا پرداخت

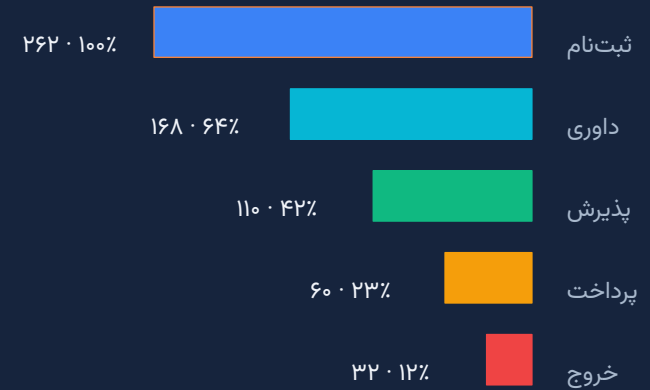

برای دیدن جزئیات هر شاخص، روی کارت مربوطه کلیک کنید

داده‌ها از سه شکاف اجرایی و یک مسئله طراحی حکایت دارند

وضعیت موجود

تمرکز ۳ استان	میانگین مصوب	نرخ پرداخت	شکاف مصوبه	نرخ خروج
۴۸.۵٪	۱.۲۹	۳۶.۲٪	۴۰.۶٪	۲۷.۲٪
از ثبت‌نام‌ها	م.ت / پذیرش	پرداخت به مصوب پارک	پارک در برابر صندوق	از مصوب پارک

۰۱ واقعی **نشتی پیش از داوری:** ۳۸.۶۵ میلیارد تومان از ۱۴۲.۱ مصوب پارک در ۳۲ پرونده و عمدتاً به دلیل نقص مدارک از دستور کار خارج شد؛ این رقم از کل پرداخت سال به مراکز کوچک بیشتر است.

۰۲ **شکاف دو مصوبه:** صندوق فقط ۵۹.۴٪ مصوب پارک را پذیرفت؛ این شکاف در پرونده‌های بزرگ‌تر بیشتر است (دانشگاه تبریز: ۴.۵ در برابر ۱.۵ میلیارد).

۰۳ **پراکندگی نرخ پذیرش:** از ۰٪ (قزوین و خراسان جنوبی) تا ۱۰۰٪ (شاهرود و البرز)؛ تفاوت به‌تنهایی اثبات استاندارد یکسان نیست، اما نیازمند بررسی چارچوب مشترک ارزیابی است.

۰۴ **تمرکز جغرافیایی:** یزد به‌تنهایی ۲۹٪ ثبت‌نام‌ها را دارد؛ اردبیل و گیلان در ۱۴۰۴ هیچ ثبت‌نامی نداشتند؛ الگوی توزیع تقاضا نیازمند بررسی با ظرفیت بومی استان‌هاست.

۰۵ درخواست **نزدیکی به سقف:** میانگین نسبت مبلغ مصوب به سقف ۸۸.۸٪ است؛ این الگو فرضیه غلبه سقف ثابت بر برآورد نیاز را مطرح می‌کند و نیازمند مقایسه اولیه، مصوب و دلایل تعدیل هر پرونده است.

پنج عارضه در طول چرخه حمایت

عارضه‌ها · کلیک کنید

۵ — پایش میان‌دوره و پایان‌دوره

بالا

۲

ردیف از ۲۶۲ پرونده

سازوکار منسجمی برای پایش اثر پرداخت وجود ندارد؛ ستون راهبری عملاً خالی است.

◂ جزئیات

۴ — شکاف اطلاعاتی داور و متقاضی

بالا

۵.۸

م.ت مازندران — بزرگ‌ترین کشف

هوش مصنوعی در تدوین طرح، غیبت فرد فنی در جلسه و ارائه‌های غیرآماده، داوری را دشوار می‌کند.

◂ جزئیات

۳ — طبقه‌بندی استراتژیک طرح‌ها

بالا

۰–۱۰۰٪

پراکندگی نرخ پذیرش مراکز

نرخ پذیرش بین مراکز تفاوت گسترده دارد؛ چارچوب مشترک برای مقایسه وجود ندارد.

◂ جزئیات

۲ — غلبه سقف ثابت بر منطق ارزش‌گذاری

بحرانی

۴۰.۶٪

شکاف مصوبه پارک و صندوق

سقف ثابت ۱.۵ میلیاردی می‌تواند بر برآورد مستقل نیاز مالی اثر بگذارد؛ این فرضیه باید با داده درخواست اولیه و مبلغ نهایی آزمون شود.

◂ جزئیات

۱ — پیش‌ارزیابی صلاحیت اجرایی

بحرانی

۳۸.۶۵

م.ت خروج از دستور

پرونده بیش از پرداخت ۳۲ خارج شد، عمدتاً به دلیل نقص مدارک — قابل شناسایی پیش از داوری.

◂ جزئیات

عارضه‌های بحرانی ۱ و ۲ در فراخوان بعدی ۱۴۰۵ قابل مداخله‌اند — روی هر کارت کلیک کنید

اولویت مداخله: ابتدا گلوگاه‌های پراثر



راهنمای ماتریس

بحرانی · فوری
عارضه ۱ و ۲

بالا · میان‌مدت
عارضه ۳، ۴ و ۵

عارضه‌های ۱ و ۲ در فوری‌ترین و شدیدترین نقطه قرار دارند — مداخله در فراخوان بعدی ۱۴۰۵.

تغییر پیشنهادی، عبور از احراز شرایط به مدیریت ارزش

مدل پیشنهادی

مدل فعلی ✕

ممیزی هزینه‌محور

- «داور می‌پرسد: «آیا این طرح واجد شرایط است؟
- مبلغ با سقف ثابت تطبیق داده می‌شود
- پرداخت ۵۰-۵۰ بدون پیوند به پیشرفت
- پس از پرداخت، هیچ پایشی وجود ندارد
- مجری تخصیص منابع

مدل پیشنهادی ✓

ارزش‌گذاری استراتژیک

- «داور می‌پرسد: «این طرح چقدر می‌ارزد؟
- مبلغ از فرمول امتیاز، ریسک و سقف می‌آید
- پرداخت ۳۰-۴۰-۳۰ مبتنی بر مایلستون
- پایش ۶/۱۲/۱۸ ماهه با حلقه بازخورد
- نقش کارگزاری: مدیر پورتفوی فناوری

مدل پیشنهادی: شش تصمیم پیوسته از صلاحیت تا اثر

مدل پیشنهادی ـ کلیک کنید

ایستگاه ۱
گیت صلاحیت
قبول / رد
حل عارضه ۱ ↳
◂ جزئیات

ایستگاه ۲
رده‌بندی استراتژیک
سقف ۳۰ / ۱۵ / ۸
حل عارضه ۳ ↳
◂ جزئیات

ایستگاه ۳
نمره‌دهی چهاربُعدی
امتیاز ۰–۱۰۰
حل عارضه ۲ ↳
◂ جزئیات

ایستگاه ۴
تعدیل ریسک
ضریب ۰.۷–۱.۳
حل عارضه ۲ ↳
◂ جزئیات

ایستگاه ۵
تعیین مبلغ
مبلغ + ۳۰-۴۰-۳۰
حل عارضه ۲ ↳
◂ جزئیات

ایستگاه ۶
پاپش و بازخورد
بازخورد به ایستگاه ۳
حل عارضه ۵ ↳
◂ جزئیات

هر ایستگاه یک تصمیم می‌گیرد و ورودی ایستگاه بعدی را می‌سازد. روی هر ایستگاه کلیک کنید.

تفاوت مدل پیشنهادی در منطق تصمیم‌گیری است

مدل فعلی ✕	
منطق تعیین مبلغ	تعدیل درخواست نسبت به سقف ثابت
سقف حمایتی	میلیارد تومان برای همه ۱.۵
پیش‌ارزیابی صلاحیت	کنترل‌های موجود؛ دامنه نامشخص
طبقه‌بندی طرح‌ها	ندارد
ابزار داوری	ارائه شفاهی و بیزنس‌پلن
ساختار پرداخت	دو مرحله ۵۰-۵۰
پایش پس از پرداخت	ندارد
نقش داور	ممیز واجد شرایط بودن
نقش کارگزاری	توزیع‌کننده بودجه

مدل پیشنهادی ✓	
منطق تعیین مبلغ	فرمول ارزش‌گذاری (امتیاز × ریسک × سقف)
سقف حمایتی	متغیر بر اساس سطح (۸ / ۱۵ / ۳۰)
پیش‌ارزیابی صلاحیت	گیت ۷ معیاره پیش از داوری
طبقه‌بندی طرح‌ها	سه سطح استراتژیک (الف/ب/ج)
ابزار داوری	ارائه + دموی فنی + راستی‌آزمایی بازار
ساختار پرداخت	سه مرحله مایلستون‌محور ۳۰-۴۰-۳۰
پایش پس از پرداخت	ماهه با حلقه بازخورد ۶/۱۲/۱۸
نقش داور	تحلیلگر ارزش‌گذاری
نقش کارگزاری	مدیر پورتفوی فناوری

پیش از استقرار کامل، مدل را اعتبارسنجی کنیم

پیشنهاد اجرایی

۰۱ بازآزمایی با پرونده‌های ۱۴۰۴

اجرای مدل روی پرونده‌های گذشته و مقایسه خروجی آن با تصمیم‌ها و مبالغ واقعی؛ بدون بازنویسی نتایج تاریخی.

۰۲ سنجش توافق ارزیابان

ارزیابی چند پرونده مشترک توسط داوران مختلف و اندازه‌گیری میزان همگرایی امتیازها و دلایل اختلاف.

۰۳ تحلیل حساسیت فرمول

بررسی اثر تغییر وزن معیارها، ضریب ریسک و سقف هر سطح بر رتبه طرح‌ها و مبلغ حمایت پیشنهادی.

۰۴ اجرای موازی در یک فراخوان

اجرای آزمایشی مدل در کنار فرایند جاری، ثبت اختلاف تصمیم‌ها و شناسایی نقاطی که نیاز به اصلاح دارند.

۰۵ تصویب نسخه نهایی بر مبنای شواهد

پس از بررسی نتایج پایلوت، اصلاح وزن‌ها و دستورالعمل‌ها و سپس تصمیم‌گیری درباره استقرار کامل مدل.

کنترل داده پیش از ارائه نهایی: در بخش‌های مختلف فایل، دامنه مراکز یک‌بار ۱۸ و در جزئیات ۲۰ مرکز ذکر شده؛ همچنین ۱۱۰ پذیرش منهای ۶۰ پرداخت، ۵۰ پرونده می‌شود، درحالی‌که متن خلاصه ۵۲ پرونده در انتظار را گزارش می‌کند. این موارد باید با منبع داده تطبیق داده شوند؛ در این نسخه هیچ‌کدام به‌صورت حدسی اصلاح نشده‌اند.

اجرا در سه فاز، با شروع از گلوگاه‌های فوری

اجرا



۱ فاز ۱ · ایستگاه ۱ و ۲

◆ تفاهم‌نامه با صندوق

۲ فاز ۲ · ایستگاه ۳ و ۴ و ۵

◆ داشبورد امتیازدهی

۳ فاز ۳ · ایستگاه ۶ (پایش)

◆ آموزش داوران

فاز ۱ · انتخاب

آبان – دی ۱۴۰۵

ایستگاه ۱ و ۲ · بدون نیاز به زیرساخت فناوری

فاز ۲ · ارزش‌گذاری

بهمن ۱۴۰۵ – شهریور ۱۴۰۶

ایستگاه ۳، ۴ و ۵ · نیازمند داشبورد و آموزش

فاز ۳ · یادگیری

پاییز ۱۴۰۶ به بعد

ایستگاه ۶ · پس از یک چرخه کامل

ماتریس مسئولیت تصمیم‌ها

اجرا

تصمیم	پارک فاوا	کارگزاری	داوران	صندوق	پارک استانی
تعیین سقف هر سطح	A	R	C	I	—
طراحی فرم امتیازدهی	C	A/R	I	I	—
طبقه‌بندی هر طرح	I	A	R	C	—
پیشنهاد مبلغ حمایتی	I	A	R	I	—
استعلام صلاحیت اجرایی	I	C	A/R	R	—
تعیین شاخص‌های کلیدی	C	A/R	I	I	—
تأیید تحویل مایلستون	I	A/R	R	I	—
پایش اثرگذاری	A	R	I	C	—
اصلاح وزن‌ها بر اساس بازخورد	A	R	I	C	—

A: پاسخگو · R: اجرا · C: مشورت · I: اطلاع

شاخص‌های کلیدی موفقیت

اجرا

نسبت خروج به مصوب پارک

باید کاهش یابد

فعلی	هدف ۱۴۰۶
۲۷.۲٪	۲۵٪

بهبود هدف: ۲.۲ واحد کاهش

کاهش نشتی بودجه پیش از داوری

نسبت پرداخت به مصوب پارک

باید افزایش یابد

فعلی	هدف ۱۴۰۶
۳۶.۲٪	۷۵٪

بهبود هدف: ۳۸.۸ واحد افزایش

افزایش تحقق پرداخت

شکاف مصوب پارک و صندوق

باید کاهش یابد

فعلی	هدف ۱۴۰۶
۴۰.۶٪	۱۵٪

بهبود هدف: ۲۵.۶ واحد کاهش

همگرایی دو مصوبه

ضریب تمایز ارزشی (شاخص محوری)

باید حداقل بماند

مبنا	هدف ۱۴۰۶
۲۹.۴٪	۳۰٪

حداقل قابل قبول: ۳۰٪ · شرط توقف: کمتر از ۱۵٪ در دو چرخه

انحراف معیار مبالغ مصوب تقسیم بر میانگین — اگر پایین بماند، مدل به تشریفات تبدیل شده است

ریسک‌های پیاده‌سازی و هشدار زودهنگام

مقاومت داوران در برابر فرمول جدید

بالا

آموزش + ساده‌سازی داشبورد + حفظ اختیار عدول با ذکر دلیل · هشدار: افزایش انحراف‌های بدون دلیل مکتوب

عدم همکاری صندوق در استعلام پیشین

بالا

تطبیق خروج مبلغی و دلایل پرونده‌ها با صندوق · هشدار: عدم امضای تفاهم‌نامه تا پایان آذر ۱۴۰۵

اعتراض شرکت‌های سطح سوم

بالا

ارائه گزارش بازخورد تفصیلی + فرایند اعتراض رسمی · هشدار: بیش از ۲۰٪ اعتراض در اولین چرخه

افزایش زمان داوری

متوسط

٪اتوماسیون محاسبات + حذف ورود دستی · هشدار: عبور از محدوده حفاظتی ۲۰

تبدیل مدل به تشریفات اداری

بالا

پایش مستمر ضریب تمایز ارزشی + گزارش دوره‌ای · هشدار: ضریب تمایز کمتر از ۱۵٪ در دو چرخه

پنج تصمیم لازم برای آغاز پایلوت

تصمیم

۱	**تغییرپذیری سقف حمایتی** سه سقف (۳۰ / ۱۵ / ۸) به جای یک سقف ثابت	پایان آذر ۱۴۰۵	هیئت‌مدیره پارک
۲	**تغییر ساختار پرداخت** از ۵۰-۵۰ به ۳۰-۴۰-۳۰ مبتنی بر پیشرفت و بازدید حضوری	پایان آذر ۱۴۰۵	پارک + صندوق
۳	**شفاف‌سازی چارچوب کمی استانی** مکتوب‌سازی هر سهمیه یا محدودیت کمی	پایان آذر ۱۴۰۵	پارک فاوا
۴	**انتقال استعلام‌های اجرایی به پیش از داوری** تفاهم‌نامه با صندوق برای استعلام بدهی، صیاد، حساب شرکتی	پایان آذر ۱۴۰۵	پارک + صندوق
۵	**تخصیص منابع انسانی و فناوری** داشبورد امتیازدهی + تیم ارزش‌گذاری + تیم پایش	پایان دی ۱۴۰۵	پارک فاوا

جمع‌بندی: مسئله روشن، مدل پیشنهادی، تصمیم مشخص

نسخه نکته کلیدی

تشخیص

نشتی ۲۷.۲٪

میلیارد تومان از مصوب پارک، پیش از هر ۳۸.۶۵ پرداختی از دستور کار خارج شد. بیش از نیمی از آن قابل پیشگیری بود.

راه‌حل

ایستگاه ۶

از گیت صلاحیت تا پایش اثر — هر ایستگاه یک عارضه شناسایی‌شده را هدف می‌گیرد و ورودی ایستگاه بعدی را می‌سازد.

شرط موفقیت

تصمیم ۵

تصمیم‌های پنج‌گانه پیشنهادی، پیش از پایان آذر ۱۴۰۵، پیش‌نیاز شروع فاز اول و پایلوت در فراخوان بعدی است.

جمع‌بندی

گفت‌وگو و تصمیم‌گیری

موافقت با پایلوت، تعیین مسئول اجرا و آغاز هماهنگی با صندوق

سه گام برای شروع تغییر در فراخوان پیش‌رو

با تشکر از توجه شما

ثبت‌نام‌ها

بازگشت ◂

در سال ۱۴۰۴، ۲۶۲ ثبت‌نام در ۲۰ مرکز از ۱۴ استان ثبت شد. سه مرکز یزد، مازندران و کهگیلویه‌وبویراحمد ۴۸.۵٪ ثبت‌نام‌ها را در اختیار داشتند. اردبیل و گیلان هیچ ثبت‌نامی نداشتند.

مرکز	ثبت‌نام	سهم
یزد	۷۶	۲۹٪
مازندران	۳۱	۱۱.۸٪
کهگیلویه	۲۰	۷.۶٪
سایر (۱۷ مرکز)	۱۳۵	۵۱.۵٪

داوری

بازگشت ◂

طرح از ۲۶۲ ثبت‌نام (۶۴.۱٪) به مرحله داوری رسیدند. فاصله ثبت‌نام تا داوری ۹۴ مورد است — این فاصله لزوماً ریزش نیست و می‌تواند شامل پرونده‌های در انتظار، ناقص یا منصرف باشد.

شاخص	مقدار
نرخ ورود به داوری	۶۴.۱٪
فاصله ثبت‌نام تا داوری	پرونده ۹۴
فاصله داوری تا پذیرش	پرونده ۵۸

پذیرش

بازگشت ◂

طرح از ۱۶۸ داوری‌شده (۶۵.۵٪) و ۴۲٪ از کل ثبت‌نام‌ها پذیرفته شدند. میانگین مصوب پارک به ازای هر پذیرش ۱.۲۹ میلیارد تومان است ۱۱۰.

شاخص	مقدار
نرخ پذیرش از داوری	۶۵.۵٪
نرخ پذیرش از ثبت‌نام	۴۲٪
میانگین مصوب به ازای پذیرش	۱.۲۹ م.ت

مصوب پارک

بازگشت ◂

مجموع مصوب پارک فاوا در ۱۴۰۴ برابر ۱۴۲.۱ میلیارد تومان (۱٬۴۲۱ میلیارد ریال). این رقم از سوابق پرداخت صندوق و صورت‌وضعیت مراکز استخراج شده است.

مرکز	مصوب پارک (م.ت)
یزد	۳۹.۷
مازندران	۲۰.۳
شاهرود-آیسا	۱۱.۵
اصفهان	۱۰.۵
سایر (۱۶ مرکز)	۵۹.۱

مصوب صندوق

بازگشت ◂

مجموع مصوب صندوق پژوهش و فناوری ۸۴.۴۵ میلیارد تومان — معادل ۵۹.۴٪ مصوب پارک. یعنی ۵۷.۶۵ میلیارد تومان از مصوب پارک به صندوق نرسید.

شاخص	مقدار
مصوب صندوق	م.ت ۸۴.۴۵
نسبت به مصوب پارک	۵۹.۴٪
شکاف	م.ت ۵۷.۶۵

خروج از دستور کار

۳۸.۶۵ (۲۱ پرونده) عدم تکمیل مدارک غالب: علت خارج شد. کار دستور از پرونده ۳۲ در — صندوق مصوب ٪۴۵.۸ و پارک مصوب ٪۲۷.۲ — معادل تومان میلیارد.

مرکز	خروج (م.ت)	سهم از مصوب
یزد	۱۵.۱	۳۸٪
مازندران	۵.۸	۲۹٪
اصفهان	۴.۵	۴۳٪
کرمانشاه	۳.۵	۱۰۰٪
سایر	۹.۷۵	—

عارضه ۱ · پیش‌ارزیابی صلاحیت اجرایی

بازگشت ◂

در ۱۴۰۴، ۳۸.۶۵ میلیارد تومان معادل ۲۷.۲٪ مصوب پارک، در ۳۲ پرونده از دستور کار خارج شد. علت غالب (۲۱ پرونده): عدم تکمیل مدارک در بازه اعلام‌شده.

نمونه‌های شاخص

- کرمانشاه: ۳.۵ میلیارد مصوب، ۳.۵ میلیارد خروج، صفر پرداخت. هر سه پرونده پیش از هر پرداختی خارج شدند.
- یزد: ۱۵.۱ میلیارد خروج از ۳۹.۷ مصوب (۳۸٪) — بیشترین مبلغ مطلق در شبکه.
- اصفهان (شهرک علمی): ۴.۵ میلیارد خروج از ۱۰.۵ مصوب (۴۳٪).

راه‌حل پیشنهادی

زودهنگام گیت ۷ معیاره پیش از داوری: شخصیت حقوقی، بدهی بانکی، چک برگشتی، حساب شرکتی، بدهی به صندوق، عضویت در پارک، مدارک هویتی. با تفاهم‌نامه با صندوق، امکان شناسایی و رفع نقص وجود دارد.

عارضه ۲ · تقلیل ارزش‌گذاری به سقف‌سازی

بازگشت ◂

در ۱۴۰۴، ۳۸.۶۵ میلیارد تومان معادل ۲۷.۲٪ مصوب پارک، در ۳۲ پرونده از دستور کار خارج شد. علت غالب (۲۱ پرونده): عدم تکمیل مدارک در بازه اعلام‌شده.

نمونه‌های شاخص

- دانشگاه تبریز: مصوب پارک ۴.۵، مصوب صندوق ۱.۵ — یک‌سوم.
- مازندران: ۲۰.۳٪ در برابر ۱۰.۰ — شکاف ۵۰٪.
- یزد (بزرگ‌ترین مرکز): ۳۹.۷٪ در برابر ۲۳.۶ — شکاف ۴۰٪.
- میانگین نسبت مبلغ به سقف: ۸۸.۸٪ — یعنی اکثر پیشنهادها نزدیک سقف.

راه‌حل پیشنهادی

نکته کلیدی: صندوق با کاهش مبلغ، عملاً نشان می‌دهد رقم پیشنهادی داور با نیاز واقعی طرح فاصله دارد. این شکاف باید در چارچوب ارزش‌گذاری شفاف حل شود.

عارضه ۳ · طبقه‌بندی استراتژیک طرح‌ها

نرخ پذیرش بین مراکز از ۰٪ تا ۱۰۰٪ نوسان دارد. بدون چارچوب مشترک، مقایسه بین استان‌ها و طرح‌ها دشوار است.

شواهد

- شاهرود-آیسا و البرز: ۱۰۰٪ پذیرش — همه ثبت‌نام‌ها پذیرفته شدند.
- قزوین و خراسان جنوبی: ۰٪ پذیرش — هیچ طرحی از داوری عبور نکرد.
- یزد (بزرگ‌ترین مرکز): ۳۰٪ پذیرش — ۷۰٪ طرح‌ها رد شدند.

راه‌حل پیشنهادی

طبقه‌بندی سه‌سطحی (الف/ب/ج) بر اساس مقیاس‌پذیری و اولویت استراتژیک، به‌عنوان مکمل داوری فنی موجود، نه جایگزین آن.

عارضه ۴ · شکاف اطلاعاتی داور و متقاضی

بازگشت ◂

داور در یک جلسه ۳۰–۶۰ دقیقه‌ای باید عمق دانش فنی تیم، واقعیت بازار و قابلیت اجرای طرح را بسنجد. سه ریشه اصلی این شکاف:

ریشه‌های شکاف

- غیبت فرد فنی: مدیرعامل یا عضو غیرفنی ارائه می‌دهد؛ فرد مسلط بر جزئیات فنی حاضر نیست.
- اتکای به هوش مصنوعی: اسناد ظاهراً حرفه‌ای، اما در پرسش‌های عمیق، تیم اشراف کافی ندارد.
- عدم آمادگی ساختاریافته: تیم‌ها با پاورپوینت وارد جلسه می‌شوند، در برابر پرسش‌های چالشی دفاع نمی‌کنند.

شاهد کمّی و راه‌حل

شاهد کمّی: مازندران — ۵.۸ میلیارد تومان خروج در ۷ پرونده. راه‌حل: ابزارهای مکمل — دموی فنی، کدریویو، راستی‌آزمایی بازار — برای سطح الف.

عارضه ۵ · پایش میان‌دوره و پایان‌دوره

بازگشت ◂

سازوکار منسجمی برای پایش اثر پرداخت، مایلستون فنی یا بازگشت سرمایه وجود ندارد. ستون «راهبری پیشرفت ۵۰٪» در سوابق، فقط برای ۲ ردیف از ۲۶۲ پرونده پر است.

پیامد

- بدون حلقه بازخورد، خطاهای هر فراخوان در فراخوان بعدی تکرار می‌شود.
- شرکت‌هایی که تسهیلات را «وام عادی» می‌دانند، پس از مواجهه با شرایط صندوق (تضامین، بازپرداخت، گزارش‌دهی) منصرف می‌شوند.
- پرونده هنوز هیچ پرداختی نگرفته‌اند؛ این یعنی تعهدات پارک به‌طور کامل محقق نشده ۵۲.

راه‌حل پیشنهادی

پایش ۶/۱۲/۱۸ ماهه با شاخص‌های ساده (تحویل مایلستون، رشد درآمد، اشتغال، جذب سرمایه خصوصی) و حلقه بازخورد به ایستگاه ۳.

ایستگاه ۰۱ · گیت صلاحیت

بازگشت ◂

هدف: حذف طرح‌های فاقد صلاحیت اجرایی، پیش از ورود به داوری فنی. ۷ معیار کنترل با تفاهم‌نامه صندوق.

معیارهای پیشنهادی

- داشتن شخصیت حقوقی (ثبت شرکت)
- نداشتن بدهی معوق بانکی
- نداشتن چک برگشتی هیئت‌مدیره
- داشتن حساب و دسته‌چک شرکتی
- نداشتن بدهی به صندوق
- عضویت فعال در پارک استانی
- مدارک هویتی و ثبتی کامل

چرا؟

میلیارد تومان خروج در ۱۴۰۴ — ۲۱ پرونده از ۳۲ به دلیل نقص مدارک که با این گیت قابل شناسایی بود ۳۸.۶۵.

ایستگاه ۲ · رده‌بندی استراتژیک

بازگشت ◂

هدف: تفکیک طرح‌ها بر اساس مقیاس‌پذیری و اولویت استراتژیک به سه سطح، با سقف حمایتی متناسب.

سه سطح پیشنهادی

- سطح الف (استراتژیک ملی): تا ۳۰ میلیارد ریال — مقیاس‌پذیری بالا، اولویت ملی، ریسک بالا.
- سطح ب (رشد منطقه‌ای): تا ۱۵ میلیارد ریال — مقیاس‌پذیری متوسط، اولویت منطقه‌ای.
- سطح ج (توسعه استانی): تا ۸ میلیارد ریال — مقیاس محدود، اولویت استانی، ریسک پایین.

چرا؟

سقف ثابت ۱.۵ میلیاردی، هم طرح‌های بزرگ را محدود می‌کند و هم طرح‌های کوچک را بی‌دلیل بزرگ.

ایستگاه ۳ · نمره‌دهی چهاربُعدی

هدف: جایگزینی نمره کلی ذهنی با نمره‌دهی شفاف در چهار بُعد با وزن مشخص.

وزن‌های پیشنهادی

- مالکیت فکری، مزیت رقابتی فنی، پیچیدگی TRL، فنی و نوآوری (۳۰٪): سطح نوآوری.
- بازار و مقیاس‌پذیری (۲۵٪): اندازه بازار، کشش تقاضا، مقیاس‌پذیری، پتانسیل صادرات.
- تیم و اجرا (۲۰٪): سابقه تیم، تکمیل تخصص‌ها، توان اجرا، حضور فرد فنی اصلی.
- مالی و مدل درآمدی (۲۵٪): شفافیت درآمدی، حاشیه سود، نقطه سربه‌سر، توجیه مبلغ.

نحوه محاسبه

هر زیرمعیار ۱–۵ امتیاز می‌گیرد. امتیاز کل × ۲۰ = امتیاز نهایی ۰–۱۰۰.

ایستگاه ۴ · تعدیل ریسک

بازگشت ◂

هدف: تعدیل امتیاز ایستا بر اساس سطح ریسک واقعی طرح — سه عامل: تکنولوژیک، بازار، اجرا.

فرمول

- R_Avg = (R_Tech + R_Market + R_Exec) / 3
- Coefficient = 0.7 + ((R_Avg - 1) × 0.15)

سه سطح ضریب

ضریب ۰.۷: طرح پرریسک — مبلغ حمایتی ۳۰٪ کاهش.
ضریب ۱.۰: طرح متوسط — بدون تعدیل.
ضریب ۱.۳: طرح کم‌ریسک — مبلغ حمایتی ۳۰٪ افزایش.

ایستگاه ۵ · تعیین مبلغ و پرداخت

بازگشت ◂

هدف: محاسبه مبلغ بهینه با فرمول و ساختار پرداخت مایلستون‌محور.

فرمول و سه سناریو

- Support = min(Requested × Score/100 × Coefficient , Ceiling)
- قوی (سطح الف، امتیاز ۸۸، ضریب ۱.۲): درخواست ۲۵ ← مبلغ ۲۶.۴ میلیارد ریال
- متوسط (سطح ب، امتیاز ۷۲، ضریب ۱.۰): درخواست ۱۵ ← مبلغ ۱۰.۸ میلیارد ریال
- ضعیف (سطح ج، امتیاز ۵۸، ضریب ۰.۸): درخواست ۱۰ ← مبلغ ۴.۶ میلیارد ریال (به جای سقف ۱۰)

ساختار پرداخت ۳۰-۴۰-۳۰

مرحله ۱ (۳۰٪): امضای قرارداد + برنامه اجرایی · مرحله ۲ (۴۰٪): تحویل مایلستون فنی اول · مرحله ۳ (۳۰٪): محصول نهایی + گزارش اثرگذاری

ایستگاه ۶ · پایش و بازخورد

بازگشت ◂

هدف: سنجش اثر افزوده واقعی تسهیلات بر رشد شرکت و اکوسیستم، و بازگرداندن نتیجه به ایستگاه ۳ برای اصلاح وزن‌ها.

سه بازه پایش

- ماه: تحویل مایلستون اول، شروع استخدام، پیشرفت فنی ۶
- ماه: رشد درآمد، اشتغال‌زایی، جذب سرمایه خصوصی، وضعیت محصول ۱۲
- ماه: اثر اکوسیستمی، بازگشت سرمایه حاکمیتی، تحلیل انحراف از پیش‌بینی ۱۸

حلقه بازخورد

نتایج پایش به ایستگاه ۳ برمی‌گردد تا وزن‌ها و سقف‌های فراخوان بعدی اصلاح شوند. بدون این حلقه، مدل به یک تشریفات اداری تبدیل می‌شود.
